


Thusis, Mai 2025

Instandsetzung Kreisel und Neubau Bushaltestelle Rappagugg Öffnung Rappaguggweg ab 14. Juni 2025

Nachdem die ersten Bauetappen für die Instandsetzung des Kreisels Süd „Rappagugg“ abgeschlossen werden konnten, wird die Baustelleninstallation erstmals umgestellt.

Das bedeutet, dass die Stützmauer und deren Hinterfüllung bis zum 14. Juni 2025 so weit fertiggestellt sein werden, dass der Rappaguggweg wieder befahrbar ist. Der Belagseinbau und dessen Unterbrechung werden zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt und kommuniziert. Die komplette Umstellung von Hauptphase 1 auf 2 wird jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Projektübersicht:

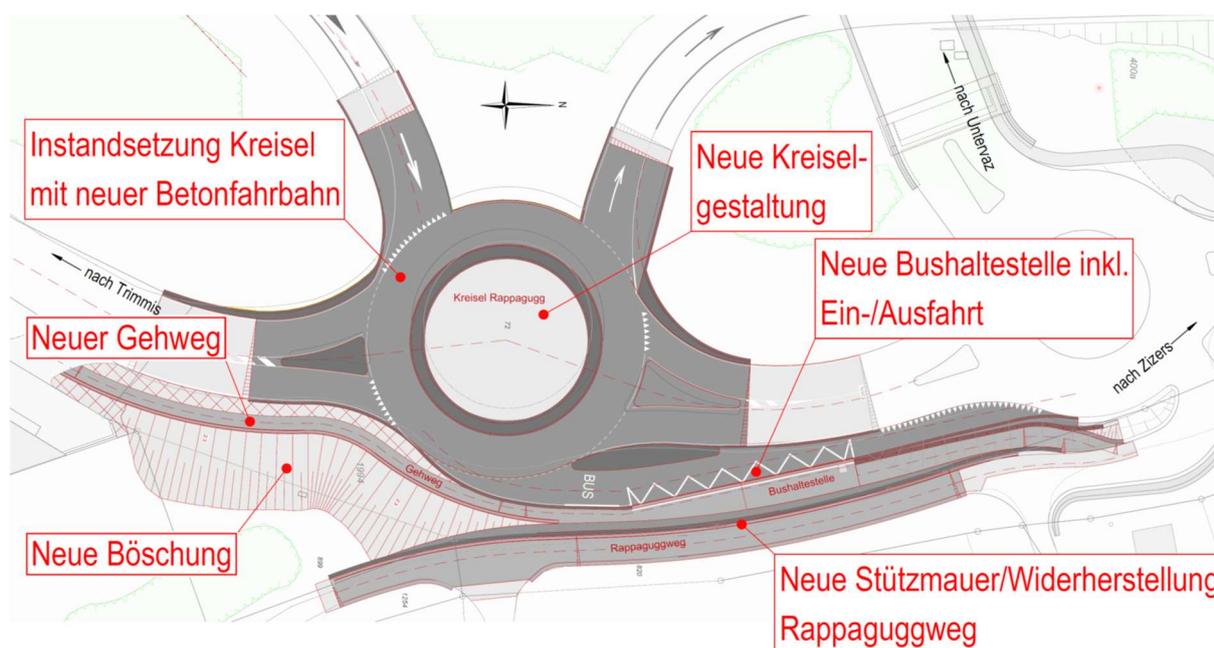

Bauablauf:


Die Bauarbeiten werden in zwei Hauptbauphasen gegliedert. Der Verkehr wird abgesehen von einzelnen kurzen Sperrungen der Ein- und Ausfahrten der Autobahn im Bereich der Baustelle abgewickelt.

Der Baustart ist am 20. Januar 2025 erfolgt. Aktuell läuft die Hauptbauphase 1, welche voraussichtlich bis nach den Sommerferien dauert.

Hauptbauphase 1

In der ersten Bauphase wird der Verkehr umgestellt und die Signalisation provisorisch angepasst. Es werden provisorische Ein- und Ausfahrten auf die Nationalstrasse erstellt. Gestartet wird mit den Aushub- und Böschungssicherungsarbeiten. Die neue Stützmauer wird gebaut und es laufen Vorbereitungsarbeiten für die Strassenbauarbeiten am Kreisel. Oberhalb der neuen Stützmauer werden Werkleitungen verlegt.

Der Rappaguggweg oberhalb der Böschung ist in dieser Phase bis zum 14. Juni 2025 gesperrt.

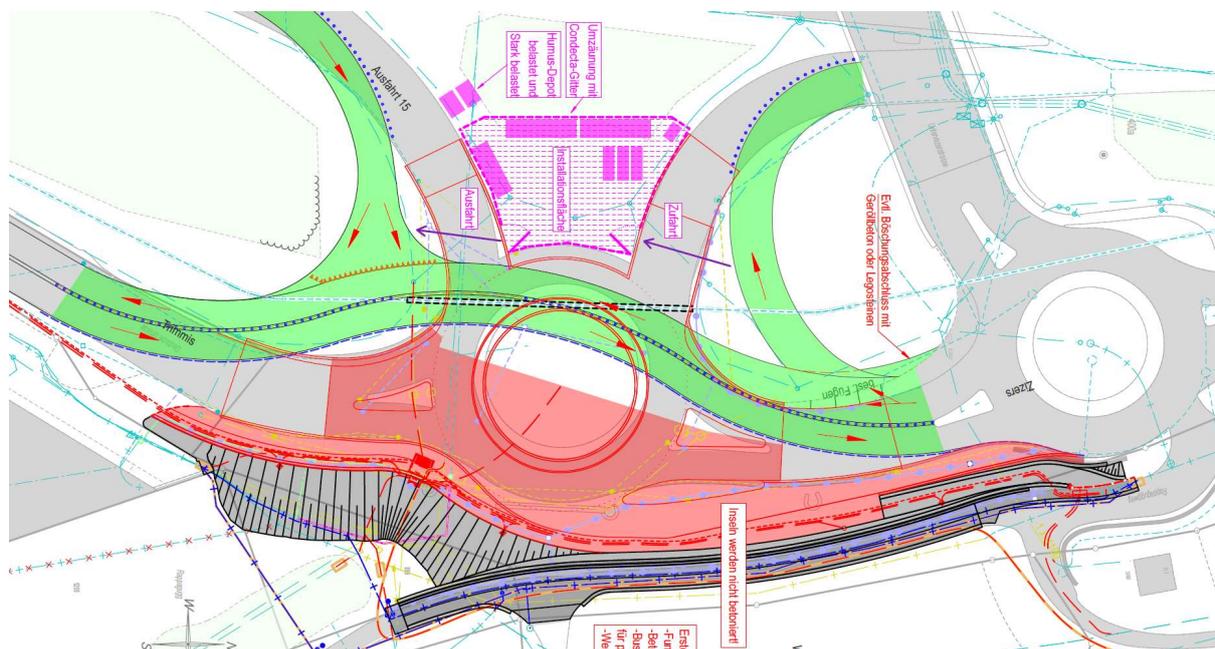

Hauptbauphase 2

In der zweiten Bauphase wird der Verkehr nochmals umgestellt und die Signalisation provisorisch angepasst. Der Kreisel wird in Etappen neu gebaut. Oberhalb der neuen Stützmauer wird der definitive Belag eingebaut.

Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Ende 2025 fertiggestellt sein.
